



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ

STRATEGIE CLLD MAS HOLICKO

v období 18. 8. 2016 - 31. 12. 2017

Zpracovatel: Kontrolní výbor MAS Holicko

Konzultant: Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

Obsah

1. ÚVOD	2
1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2
1.2. INFORMACE O PODANÝCH/ SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH STRATEGIE CLLD	2
1.3. OPATŘENÍ PŘI NEPLNĚNÍ ULOŽENÝCH POVINNOSTÍ	2
2. REALIZACE STRATEGIE CLLD	2
2.1. PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV	3
2.1.1. Výzva MAS Holicko č. 2 - PRV	4
2.1.2. 1. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2017)	6
2.1.3. 2. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2017)	7
2.1.4. Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018	9
2.2. PRŮBĚH ADMINISTRACE VÝZEV	11
2.3. KATEGORIE PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ	12
2.4. MÍSTA REALIZACE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ	13
3. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ STRATEGIE CLLD	15
3.1. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV	15
3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce PRV	16
3.1.2. Plnění finančního plánu Programového rámce PRV	16
3.1.3. Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV	18
3.2. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP	18
3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP	19
3.2.2. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP	19
3.2.3. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP	20
3.3. VĚCNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ SCLLD MIMO PROGRAMOVÉ RÁMCE	21
3.4. INFORMACE O DOSAŽENÝCH SYNERGICKÝCH EFEKTECH NA ÚROVNI OPATŘENÍ RESP. PODOPATŘENÍ STRATEGIE	26
3.5. HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY	26
4. ANIMACE STRATEGIE CLLD	27
4.1. PROPAGACE STRATEGIE CLLD	27
4.2. PODPORA ŽADATELŮ	28
4.3. ANIMACE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OPVVV	28
4.4. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PARTNERŮ MAS	29
5. INFORMACE O PROBLÉMECH A RIZICÍCH V PRŮBĚHU REALIZACE STRATEGIE CLLD	31
5.1. INFORMACE O PROBLÉMECH, KTERÉ SE VYSKYTLY V PRŮBĚHU REALIZACE SCLLD A PŘIJATÁ OPATŘENÍ	31
5.2. INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH RIZICÍCH REALIZACE SCLLD A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI	32
6. ZÁVĚR	32

1. Úvod

Předmětem této práce je vyhodnocení naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020 (SCLLD) s mottem: „Holicko – region plný života“.

Výchozím časovým obdobím pro tuto zprávu je období od 18. 8. 2016 do 31. 12. 2017, tj. vyhodnocení prvních kroků realizace SCLLD od jejího schválení řídicími orgány. Během sledovaného období byly intenzivně připravovány interní postupy MAS pro implementaci SCLLD včetně nastavení preferenčních kritérií a následně vyhlášeny 3 výzvy z obou programových rámců, které jsou uvedeny v SCLLD (1 výzva – PRV a 2 výzvy – IROP) a 1 výzva na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

1.1. Základní údaje

Název MAS:	MAS Holicko, o.p.s
Integrovaná strategie:	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020
Registrační číslo strategie:	CLLD_15_01_232
Datum schválení Strategie:	17. 8. 2016
Pořadí hodnotící zprávy:	1
Sledované období:	18. 8. 2016 – 31. 12. 2017

1.2. Informace o podaných/ schválených změnách strategie CLLD

V průběhu sledovaného období byly podány 2 žádosti o změnu SCLLD, kterým bylo vyhověno (8/2017 a 12/2017). Obě změny se týkaly změn členské základny MAS Holicko a změn složení povinných orgánů MAS, které se udály od splnění standardů MAS (16.12.2015). Ke změně obsahu strategie jako takové nedošlo.

1.3. Opatření při neplnění uložených povinností

Nerelevantní – žádná opatření ŘO nebyla vůči MAS Holicko uplatněna.

2. Realizace strategie CLLD

V průběhu roku 2016 se MAS Holicko intenzivně věnovala pouze přípravě výzev, tudíž v tomto období nebyly čerpány žádné finanční prostředky na podporu strategie CLLD, ani nebyly plněny žádné indikátory. Proto Ředitelka MAS Holicko rozhodla o tom, že hodnocení realizace SCLLD za rok 2016 se spojí s hodnocením roku 2017.

V roce 2016 manažerky pro SCLLD vytvářely interní směrnice pro administraci a hodnocení projektů (implementaci SCLLD) pro programový rámec PRV a IROP, současně s tím vytvářely hodnotící kritéria pro všechna opatření/fiche z obou programových rámců (konzultace s výběrovou komisí a experty

z území). Ve sledovaném období tedy probíhaly konzultace a schvalování těchto dokumentů Řídicími orgány. Dále byl orgány MAS schválen předběžný harmonogram výzev MAS Holicko na rok 2016 – 2023, výše uvedené interní směrnice a hodnotící kritéria.

V rámci programového rámce PRV bylo SZIF schváleno znění všech Fichí a bylo schváleno znění výzvy č.2 – PRV, která byla vyhlášena 3. 1. 2017. MAS Holicko podala na SZIF žádost i o schválení výzvy č. 1 – PRV, následně ale přišla na to, že tato žádost byla podána s chybnými údaji, a tak tato výzva byla stornována.

V rámci programového rámce IROP bylo CRR a MMR schváleno znění interních postupů pro implementaci SCLLD včetně hodnotících kritérií pro všechna opatření.

V roce 2017 MAS Holicko vyhlásila 3 výzvy příjmu žádostí o podporu pro oba programové rámce SCLLD a 1 výzvu na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje. V rámci těchto výzev poskytovala MAS Holicko potencionálním příjemcům podporu, ať již formou konzultací (osobní, telefon, e-mail) tak i formou realizovaných seminářů. V průběhu celého roku probíhala administrace těchto výzev (hodnocení a výběr projektů, komunikace se žadateli a řídicími orgány, apod.) a zároveň příprava výzev, které jsou v plánu vyhlásit v roce 2018.

V rámci programového rámce PRV byla vyhlášena 1 výzva, v rámci které byly přijaty 4 žádosti o dotaci. Vybrané žádosti MAS byly v 10 a 12/2017 také schváleny SZIFem (výše dotace: 3.241.689Kč). V tomto období ještě nebyly plněny žádné indikátory v rámci programového rámce PRV, protože žádný vybraný projekt ještě nebyl ukončen.

V rámci programového rámce IROP byly vyhlášeny 2 výzvy, v rámci kterých bylo přijato celkem 6 žádostí o podporu. V 11/2017 bylo 5 vybraných žádostí MAS předáno na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti. V tomto období tedy zatím nebyly čerpány žádné finanční prostředky a ani nebyly plněny žádné indikátory v rámci programového rámce IROP, protože zatím žádný projekt nebyl Řídicím orgánem vybrán k podpoře.

Dále v létě roku 2017 byla provedena aktualizace Programu obnovy venkova Pardubického kraje, díky níž mohly MAS podpořit projekty zaměřené na občanskou vybavenost obcí regionu. MAS Holicko tohoto využila a v 10/2017 vyhlásila výzvu „Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018“, v rámci které bylo přijato 13 žádostí o podporu. 12 z nich bylo MAS vybráno k podpoře a následně předloženo na Pardubický kraj ke schválení.

2.1. Přehled vyhlášených výzev

V roce 2017 MAS Holicko vyhlásila a úspěšně zrealizovala 3 výzvy pro oba programové rámce SCLLD (1x programový rámec PRV, 2x programový rámec IROP). Úspěšně zrealizovaná výzva znamená, že Programový výbor na základě hodnocení Výběrové komise schválil k financování minimálně 1 projekt, který byl následně předán k závěrečnému ověření na Řídicí orgán.

Tabulka 1 – Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS

	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD	SKUTEČNOST		
	Cílová hodnota	2016	2017	Celkem
Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	15	0	3	3

Kromě toho MAS Holicko vyhlásila a úspěšně zrealizovala ještě 1 výzvu, a to výzvu na Malý LEADER pro Holicko z financí Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Tato výzva nevychází ze žádného programového rámce CLLD – pomáhá podpořit projektové záměry, které jsou uvedeny ve strategii, ale nemohly být podpořeny z programových rámců. Z tohoto důvodu se tato výzva nezapočítává do povinných indikátorů sledujících průběh realizace SCLLD (tabulka výše).

2.1.1. Výzva MAS Holicko č. 2 - PRV

Vyhlášení výzvy: 3.1.2017

Příjem žádostí: 17.1.2017 - 3.2.2017

Vyhlášené Fiche: 1 – Podpora zemědělských podniků, 3 – Podpora malých podniků a 4 – Ochrana lesních porostů

Finanční alokace: 3.747.358,-Kč

Tabulka 2 – Finanční alokace pro výzvu MAS Holicko č. 2 - PRV

Výzva č. 2 - PRV	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace - MAS
1 – Podpora zemědělských podniků	1.631.207,00 Kč	3	3.048.328,00 Kč	3	3.048.328,00 Kč
3 – Podpora malých podniků	1.648.569,00 Kč	0	0 Kč	0	0 Kč
4 – Ochrana lesních porostů	467.582,00 Kč	1	195.111,00 Kč	1	195.111,00 Kč
Celkem	3.747.358,00 Kč	4	3.243.439,00 Kč	4	3.243.439,00 Kč

Průběh výzvy: Byly přijaty celkem 4 žádosti o dotaci (3 žádosti do Fiche 1 a 1 žádost do Fiche 4. V rámci Fiche 3 nebyla podána žádná žádost.). Všechny prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti s kladným výsledkem. U všech žádostí proběhlo místní šetření (provedl vedoucí pracovník pro CLLD).

Tabulka 3 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.2 - PRV

Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet získaných bodů	Status	Výše schválené dotace *
Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků						3.046.578,-Kč
2017/02/004	Mgr. LEONA MÁLKOVÁ	Mechanizace pro chov a výcvik koní	Horní Jelení	68	Schválený SZIF	600.000,-Kč
2017/02/002	Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.	Pořízení nové techniky pro moderní ošetřování a krmení skotu	Ostřetín	65	Schválený SZIF	998.250,-Kč
2017/02/003	PAVEL SOCHOR	Stavební úpravy silážního žlabu na seník	Dolní Roveň	56	Schválený SZIF	1.448.328,-Kč
Fiche 3 – Podpora malých podniků						-
V rámci této Fiche nebyly podány žádné žádosti o dotaci						
Fiche 4 – Ochrana lesních porostů						195.111,- Kč
2017/02/001	"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."	Ochrana MZD oplocením MAS	Vysoké Chvojno, Býšť, Pobežovice, Chvojenc, Nová Ves	70	Podepsaný právní akt	195.111,-Kč

*Výše schválené dotace uvedené v tabulce 2 je výše dotace, kterou jednotlivým projektům schválil SZIF v 10 a 12/2017. Rozdíl (oproti tabulce 1) vznikl díky uskutečněným výběrovým řízením jednotlivými žadateli po odevzdání jejich žádostí na SZIF.

Výběrová komise zasedla v termínech 29.3.2017 a 12.4.2017 (veřejná obhajoba projektů). Všechny žádosti splnily minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 19.4.2017 o přesunu přebývajících alokací z Fiche 3 a 4 do Fiche 1, kde byl naopak převis projektů a následně schválil všechny projekty. Nevyužitá částka ve výši 503.919,- Kč bude převedena do nejbližší výzvy programového rámce PRV.

Dne 31.5.2017 byly všechny žádosti o dotaci předány na SZIF k jejich kontrole. 16.10.2017 byl schválen SZIFem projekt, který nemusel dokládat výběrové řízení. 21.12.2017 byly schváleny i ostatní projekty výzvy, které výběrové řízení dokládaly.

Tabulka 4 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.2 – PRV – Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků

Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	3
Počet projektů týkající se živočišné výroby	Počet	3
Počet projektů týkající se rostlinné výroby nebo školkařské produkce	Počet	0
Počet projektů týkající se pořízení peletovacího zařízení	Počet	0
Počet projektů týkající se pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu	Počet	2
Počet inovativních projektů	Počet	2
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	2
Počet projektů využívajících stávající zařízení a objekty	Počet	3
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	Pracovní místa	0
Modernizace nevyužitých prostor	m ²	696,3
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x: 501 – 2.000 obyvatel, • 2x: 2.001 – 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Zemědělec – PO (střední podnik), • 2x Zemědělec – FO (mikropodniky).
Počet začínajících podnikatelů	Žadatel	1
Počet žen (v případě FO)	Žadatel	1
Počet držitelů regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ regionální produkt“	Žadatel	0
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	58,23%

Tabulka 5 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS Holicko č.2 – PRV – Fiche 4 – Ochrana lesních porostů

Fiche 4 – Ochrana lesních porostů	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	1
Počet inovativních projektů	Počet	0
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	1
Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy hospodářské a vybrané kategorie lesů zvl. určení (tj. lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření a uznané obory a samostatné bažantnice - kategorie uvedené v § 8 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon).	Počet	1
Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy zvláštního určení mimo lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření a uznané obory a samostatné bažantnice - kategorie uvedené pod body g) a h) odst. 2 § 8 zákona 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon).	Počet	0
Celková plocha	ha	5,59
Typ žadatele	-	• Podnikatelský subjekt – PO (velký podnik)
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	58,68%

2.1.2. 1. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2017)

Vyhlášení výzvy: 24.4.2017

Příjem žádostí: 24.4.2017 – 21.6.2017

Vyhlášené opatření: 1 – Vzdělávání

Finanční alokace: 3.066.203,-Kč

Tabulka 6 – Finanční alokace pro 1. výzvu MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2017)

1.výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2017)	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace - MAS
1 – Vzdělávání	3.066.203,00 Kč	1	1.042.884,81 Kč	1	1.042.884,81 Kč

Průběh výzvy: Byla přijata pouze 1 žádost o podporu, která prošla kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí s kladným výsledkem.

Tabulka 7 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2017)

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet získaných bodů	Status	Výše schválené dotace
Opatření 1 – Vzdělávání						1.042.884,81Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00/05563	Obec Dolní Ředice	Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v ZŠ Dolní Ředice	Dolní Ředice	60	Vybraný MAS	1.042.884,81Kč

Výběrová komise zasedla v termínech 6.9.2017 a 20.9.2017. Žádost splnila minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 18.10.2017 o schválení projektu. Nevyužitá částka ve výši 2.023.318,19 Kč bude převedena do nejbližší výzvy na Vzdělávání programového rámce IROP.

Dne 9.11.2017 byla žádost o podporu předána na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Tabulka 8 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2017)

Opatření 1 - Vzdělávání	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	1
Počet podpořených základních škol	Zařízení	1
Počet podpořených zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání	Zařízení	0
Počet podpořených zařízení pro celoživotní vzdělávání	Zařízení	0
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení	Osoby	180
Počet projektů týkající se komunikace v cizích jazycích	Počet	0
Počet projektů týkající se technických a řemeslných oborů	Projekt	1
Počet projektů týkající se přírodních věd	Projekt	1
Počet projektů týkající se schopnosti práce s digitálními technologiemi	Projekt	0
Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže	Projekt	1
Počet projektů základních škol, jejichž výstupy budou sloužit pro výuku více předmětů (kroužků)	Projekt	1
Počet projektů týkající se bezbariérovosti	Projekt	0
Počet projektů týkající se vnitřní konektivity škol a školských zařízení a připojení k internetu	Projekt	0
Počet projektů, jejichž součástí byly úpravy venkovního prostoru	Projekt	1
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Projekt	1
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	• 1x: 501 – 2.000 obyvatel
Typ žadatele	-	• Obce a jejich organizace
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	74,56%

2.1.3. 2. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2017)

Vyhlášení výzvy: 18.4.2017

Příjem žádostí: 18.4.2017 – 21.6.2017

Vyhlášené opatření: 2 – Bezpečnost silničního provozu

Finanční alokace: 6.365.805,-Kč

Tabulka 9 – Finanční alokace pro 2. výzvu MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2017)

2.výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2017)	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace - MAS
2 – Bezpečnost silničního provozu	6.365.805,00 Kč	5	4.022.890,80 Kč	4	3.612.675,45 Kč

Průběh výzvy: Bylo přijato celkem 5 žádostí o podporu. Jedna žádost o podporu (obec Jaroslav) byla vyloučena z hodnocení na základě kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. Všechny ostatní přijaté žádosti prošly tímto hodnocením s kladným výsledkem.

Tabulka 10 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci 2. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2017)

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet získaných bodů	Status	Výše schválené dotace
Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu						3.612.675,45Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005560	Obec Ostřetín	Ostřetín, chodníky podél I/35	Ostřetín	90	Vybraný MAS	826.398,29Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005553	Obec Horní Ředice	Zvýšení bezpečnosti dopravy výstavbou chodníku k základní škole v Horních Ředicích	Horní Ředice	85	Vybraný MAS	1.146.770,65Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005515	Město Holice	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Holicích - výstavba chodníku Podhráz - Holice	Holice	80	Vybraný MAS	625.316,60Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005558	Obec Dolní Ředice	Zvýšení bezpečnosti dopravy II. etapa Dolní Ředice	Dolní Ředice	80	Vybraný MAS	1.014.189,91Kč
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005561	Obec Jaroslav	Jaroslav - chodník při II/305	Jaroslav	Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti		

Výběrová komise zasedla v termínech 6.9.2017 a 20.9.2017. Všechny žádosti splnily minimální bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 18.10.2017 o schválení všech projektů, které prošly kontrolou formálních náležitostí s kladným výsledkem. Nevyužitá částka ve výši 2.753.129,55 Kč bude převedena do nejbližší výzvy na Vzdělávání programového rámce IROP.

Dne 9.11.2017 byly všechny žádosti o podporu předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Tabulka 11 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2017)

Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	4
Počet projektů týkající se chodníků nebo stezek pro pěší	Počet	4
Počet projektů řešících místa pro přecházení	Počet	2
Počet projektů týkající se realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy	Počet	2
Počet projektů, jež zajišťují přístup k centru, či občanské vybavenosti	Počet	3
Počet projektů šetrných k životnímu prostředí	Počet	4
Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	4
Délka nově vybudovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	340,11
Délka zrekonstruovaných chodníků nebo stezek pro pěší	m	151,77
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 3x: 501 – 2.000 obyvatel, • 1x: Nad 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • Obce a jejich organizace
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	27,84%

2.1.4. Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018

Vyhlášení výzvy: 4.10.2017

Příjem žádostí: 4.10.2017 – 25.10.2017

Podporované oblasti: Obnova a údržba občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní), Obnova a údržba venkovského prostoru, Obnova a údržba sportovních zařízení, Obnova a údržba sakrálních staveb, Podpora péče o krajinu, apod.

Finanční alokace: 400.000,-Kč

Tabulka 12 – Finanční alokace výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018

Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018	Finanční alokace výzvy	Počet přijatých projektů	Výše požadované dotace	Počet schválených projektů	Výše schválené dotace
Obnova a údržba občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb a podpora péče o krajinu	400.000,00 Kč	13	434.637,00 Kč	12	400.000,00 Kč

Průběh výzvy: V průběhu výzvy bylo přijato celkem 13 žádostí o podporu od 10 žadatelů (Obec Dolní Ředice podala 2 žádosti, Obec Chvojenec podala 3 žádosti). Celková požadovaná výše příspěvku činila 434.637 Kč, což bylo o více jak 34 tis. Kč více, než umožňovala výzva POV PK. Všechny žádosti prošly kontrolou formálních náležitostí s kladným výsledkem.

Tabulka 13 – Přijaté žádosti o dotaci v rámci výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet získaných bodů	Status	Výše schválené dotace
ML-2017/4	Český hudební tábor mládeže o.p.s.	Oprava čela víceúčelové haly, výměna osvětlení a ventilátoru	Ostřetín	45	Vybraný MAS	34.695,00 Kč
ML-2017/1	Tenisový klub Holice z.s.	Oprava sociálního zařízení v klubovně TK Holice z.s.	Holice	40	Vybraný MAS	35.000,00 Kč
ML-2017/7	Tělocvičná jednota Sokol Holice	Oprava dveří cvičebního sálu a obnova cvičebního nářadí sokolovny v Holicích	Holice	40	Vybraný MAS	34.655,00 Kč
ML-2017/12	Obec Jaroslav	Výměna klempířských prvků na budově bývalé školy	Jaroslav	40	Vybraný MAS	35.000,00 Kč
ML-2017/11	Obec Chvojenec	Chvojenec - doplnění sloupů se sítěmi u fotbalového hřiště, výměna stávajících sítí	Chvojenec	35	Vybraný MAS	35.000,00 Kč
ML-2017/2	Město Horní Jelení	Oprava plotu MŠ Horní Jelení	Horní Jelení	30	Vybraný MAS	33.940,00 Kč

Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu (NUTS 5)	Počet získaných bodů	Status	Výše schválené dotace
ML-2017/8	Obec Vysoké Chvojno	Výsadba zeleně na návsi obce Vysoké Chvojno	Vysoké Chvojno	30	Vybraný MAS	35.000,00 Kč
ML-2017/13	Město Holice	Oprava antukového povrchu hřiště a instalace dělicí sítě včetně nosných sloupků na hřišti Na Lipáku	Holice	30	Vybraný MAS	33.710,00 Kč
ML-2017/5	Obec Dolní Ředice	Oprava podlah spojovacích chodeb budov mateřské školy	Dolní Ředice	25	Vybraný MAS	34.558,00 Kč
ML-2017/9	Obec Chvojenec	Chvojenec - Úprava místa pro odkládání separovaného odpadu	Chvojenec	25	Vybraný MAS	29.140,00 Kč
ML-2017/3	Obec Ostřetín	Úprava prostranství před prodejnou potravin v Ostřetíně	Ostřetín	15	Vybraný MAS	35.000,00 Kč
ML-2017/6	Obec Dolní Ředice	Úprava osvětlení a ozvučení společenského sálu	Dolní Ředice	15	Vybraný MAS	24.302,00 Kč
ML-2017/10	Obec Chvojenec	Chvojenec - Výsadba zeleně u obecní cesty	Chvojenec	15	Nevybraný MAS	-

Výběrová komise zasedla v termínu 8.11.2017. Ta obodovala jednotlivé projekty a seřadila je sestupně dle získaných preferenčních kritérií a dle data a času podání žádosti na MAS. Dne 29.11.2017 proběhnul Programový výbor MAS Holicko, který schválil pořadí projektů a rozhodl o zahrnutí 12 projektů do žádosti MAS Holicko do POV PK. Aby MAS Holicko splnila podmínky výzvy POV PK, rozhodl Programový výbor o neschválení posledního třináctého projektu a o snížení požadované dotace u hraničního dvanáctého projektu, tak aby celková finanční alokace nepřesáhla 400.000Kč.

Dne 30.11.2017 byly všechny vybrané žádosti o podporu předány na Pardubický kraj ke schválení.

Tabulka 14 – Parametry schválených žádostí o dotaci v rámci výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018

Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu	Měrná jednotka	Hodnota
Počet schválených projektů celkem	Počet	12
Počet projektů zaměřených na zařízení pro spolkovou činnost	Počet	2
Počet projektů zaměřených na opravu sportovního zařízení	Počet	3
Počet projektů zaměřených na opravu multifunkčního zařízení	Počet	1
Počet projektů zaměřených na opravu kulturního zařízení	Počet	1
Počet projektů zaměřených na opravu MŠ	Počet	2
Počet projektů zaměřených na úpravu veřejného prostranství	Počet	3
Počet projektů zaměřených na podporu péče o krajinu	Počet	0
Počet zrealizovaných projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina	Počet	4
Počet projektů, jejichž výstupy podpoří komunitní život v obci (např. spolková činnost)	Počet	7
Počet projektů, jejichž výstupy podpoří práci s dětmi	Počet	7

Opatření 2 - Bezpečnost silničního provozu	Měrná jednotka	Hodnota
Velikost obce, kde je projekt realizován	-	<ul style="list-style-type: none"> • 2x: Do 500 obyvatel • 6x: 501 – 2.000 obyvatel, • 1x: 2.001 – 5.000 obyvatel • 3x: Nad 5.000 obyvatel.
Typ žadatele	-	<ul style="list-style-type: none"> • 9x: Obce a jejich organizace • 3x: NNO
Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená dotace)	%	36,52%

2.2. Průběh administrace výzev

Následující tabulka shrnuje administraci všech výzev MAS Holicko vyhlášených v roce 2017, tj. Je zde možné vyčíst, kolik žádostí o podporu bylo přijato a hodnoceno, kolik jich bylo schváleno, kolik jich je v realizaci, apod.

Protože jsme ale v tomto roce začali CLLD teprve realizovat, tak je zde vidět, že jsme hodnotili 23 projektů (administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti, věcné hodnocení). Z toho 22 projektů je stále v hodnotícím procesu (u řídicích orgánů) a pouze 1 projekt byl schválen a je v realizaci.

Tabulka 15 – Průběh administrace výzev MAS Holicko vyhlášených v roce 2017

Průběh administrace výzev	Výzva MAS Holicko č.2 - PRV	1.výzva MAS Holicko - IROP - Vzdělávání (2017)	2.výzva MAS Holicko - IROP - Bezpečnost silničního provozu (2017)	Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018	Celkem
Počet podaných projektů	4	1	5	13	23
Počet projektů vyřazených ve formálním hodnocení	0	0	1	0	1
Počet projektů vyřazených ve věcném hodnocení	0	0	0	0	0
Počet vybraných projektů	4	1	4	12	21
Počet náhradníků	0	0	0	0	0
Počet podaných odvolání na MAS	0	0	0	0	0
Počet vyřazených projektů ŘO	0	0	0	0	0
Počet podaných odvolání na ŘO	0	0	0	0	0
Počet projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace	1	0	0	0	1
Počet projektů v realizaci (neukončené k 31.12. daného roku)	1	0	0	0	1
Počet podaných Hlášení o změnách	0	0	0	0	0
Počet podaných Monitorovacích zpráv	0	0	0	0	0
Kontrola na místě realizace projektu	4	0	0	0	4
Počet podaných Závěrečných Žadostí o proplacení	0	0	0	0	0
Počet projektů v době udržitelnosti (k 31.12. daného roku)	0	0	0	0	0

2.3. Kategorie podpořených žadatelů


Níže uvedená tabulka uvádí kategorie žadatelů, kteří projekt podali a kteří byli podpořeni v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v roce 2017.

Ze zjištěných výsledků je patrné, že nejvíce podpořených žadatelů jsou obce (66,7 %). Dále po třech podpořených projektech mají zemědělci a NNO. 1 projekt byl podpořen i podnikatelskému subjektu mimo zemědělce.

Rozdílně to ale vypadá v případě částek schválené dotace. Obce získaly 59,7% dotace, zemědělci 36,7% , ostatní podnikatelské subjekty 2,4% a NNO zbylých 1,3%.

Tabulka 16 – Kategorie podpořených žadatelů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v roce 2017

Monitoring typu podpořených žadatelů	Výzva MAS Holicko č.2 - PRV	1.výzva MAS Holicko - IROP - Vzdělávání (2017)	2.výzva MAS Holicko - IROP - Bezpečnost silničního provozu (2017)	Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018	Celkem projektů	Celkem požadované / schválené dotace
Počet podaných projektů celkem	4	1	5	13	23	8.938.962,61Kč
- z toho stát a jeho organizace	0	0	0	0	0	0Kč
- z toho obce, svazky obcí nebo jejich organizace	0	1	5	10	16	5.396.062,61Kč
- z toho církve a jejich organizace	0	0	0	0	0	0Kč
- z toho NNO	0	0	0	3	3	104.350,00Kč
- z toho zemědělci	3	0	0	0	3	3.243.439,00Kč
- z toho další podnikatelské subjekty	1	0	0	0	1	195.111,00Kč
Počet podpořených projektů celkem	4	1	4	12	21	8.297.249,26Kč
- z toho stát a jeho organizace	0	0	0	0	0	0Kč
- z toho obce, svazky obcí nebo jejich organizace	0	1	4	9	14	4.951.210,26Kč
- z toho církve a jejich organizace	0	0	0	0	0	0Kč
- z toho NNO	0	0	0	3	3	104.350,00Kč
- z toho zemědělci	3	0	0	0	3	3.046.578,00Kč
- z toho další podnikatelské subjekty	1	0	0	0	1	195.111,00Kč

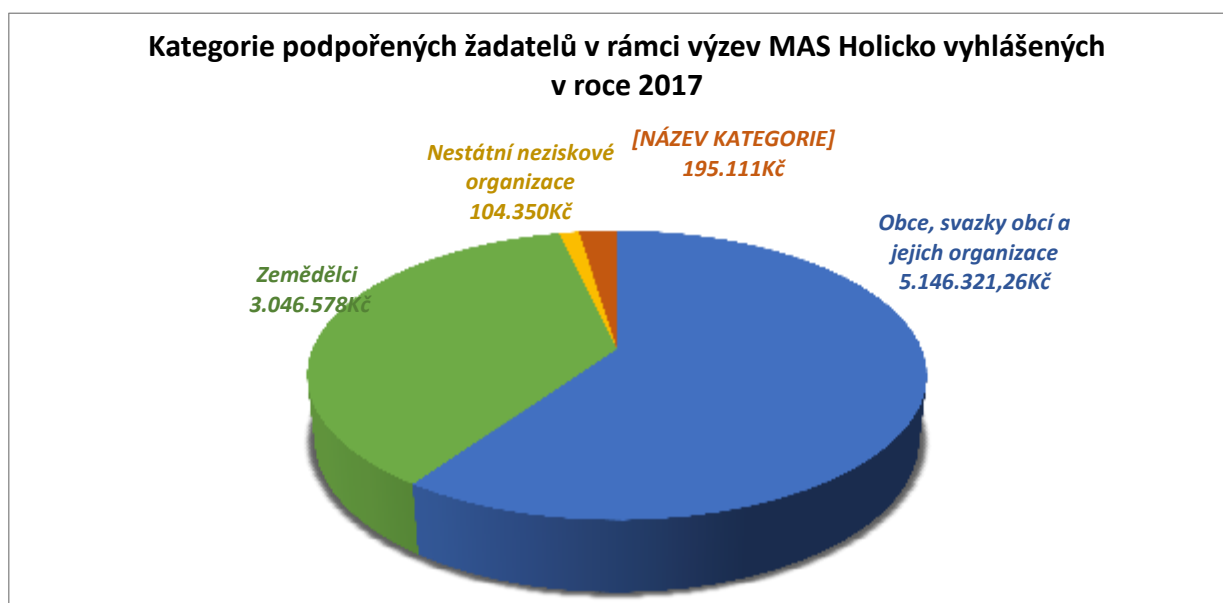

2.4. Místa realizace podpořených projektů

Následující tabulka uvádí místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v roce 2017


Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu podpořených projektů, neboť některé projekty jsou realizovány na více místech (oplocenky).

Jak je vidět již v prvním roce realizace se nám podařilo pokrýt skoro celé území MAS (kromě obcí Radhošť, Trusnov, Týnišťko a Uhersko). Nejvíce peněz poputuje do obcí Dolní Ředice, Ostřetín, Dolní Roveň a Horní Ředice.


Tabulka 17 – Místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v roce 2017

Místo realizace podpořených projektů	Výzva MAS Holicko č.2 - PRV	1.výzva MAS Holicko - IROP - Vzdělávání (2017)	2.výzva MAS Holicko - IROP - Bezpečnost silničního provozu (2017)	Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018	Celkem projektů	Celkem požadované / schválené dotace
Býšť	2	0	0	0	2 (5,6%)	24.388,88Kč (0,3%)
Dolní Roveň	1	0	0	0	1 (2,8%)	1.448.328,00Kč (17,5%)
Dolní Ředice	0	1	1	2	4 (11,1%)	2.115.934,72Kč (25,5%)
Holice	0	0	1	3	4 (11,1%)	728.681,60Kč (8,8%)
Horní Jelení	1	0	0	1	2 (5,6%)	633.940,00Kč (7,6%)
Horní Ředice	0	0	1	0	1 (2,8%)	1.146.770,65Kč (13,8%)
Chvojenec	1	0	0	2	3 (8,3%)	76.334,44Kč (0,9%)
Jaroslav	0	0	0	1	1 (2,8%)	35.000,00Kč (0,4%)
Ostřetín	1	0	1	2	4 (11,1%)	1.894.343,29Kč (22,8%)
Poběžovice u Holic	5	0	0	0	5 (13,9%)	60.972,19Kč (0,7%)
Radhošť	0	0	0	0	0	0Kč
Trusnov	0	0	0	0	0	0Kč
Týnišťko	0	0	0	0	0	0Kč
Uhersko	0	0	0	0	0	0Kč
Vysoké Chvojno	7	0	0	1	8 (22,2%)	120.361,06 Kč (1,5%)
Nová Ves	1	0	0	0	1 (2,8%)	12.194,44 Kč (0,1%)
Celkem	19	1	4	12	36	8.297.249,26 Kč

Místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v roce 2017

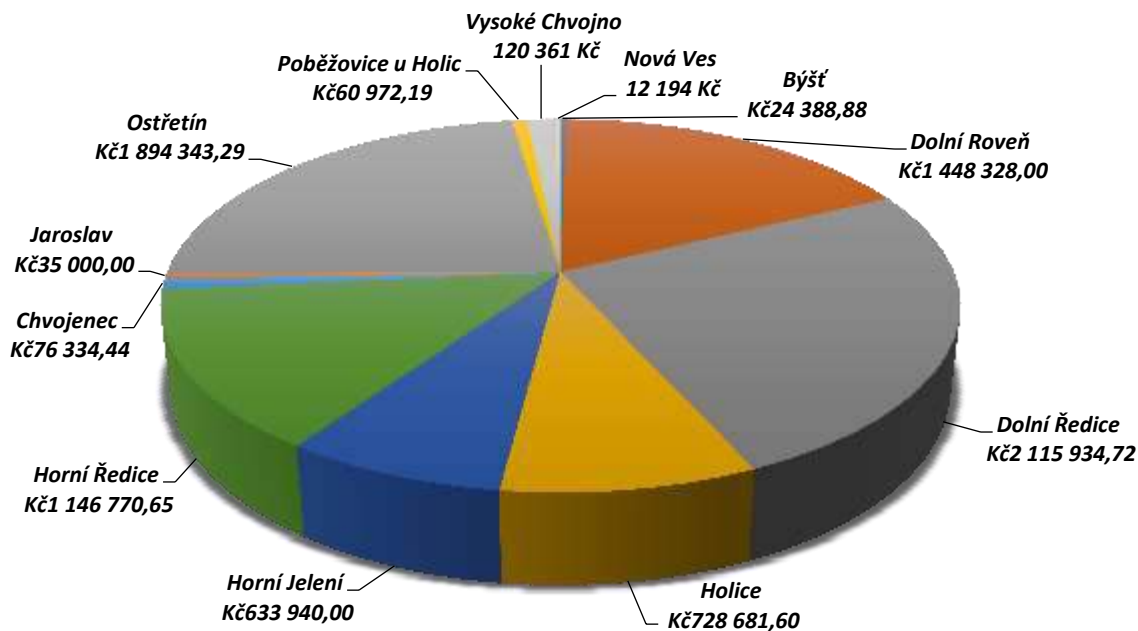

Místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v roce 2017 dle kategorií žadatelů

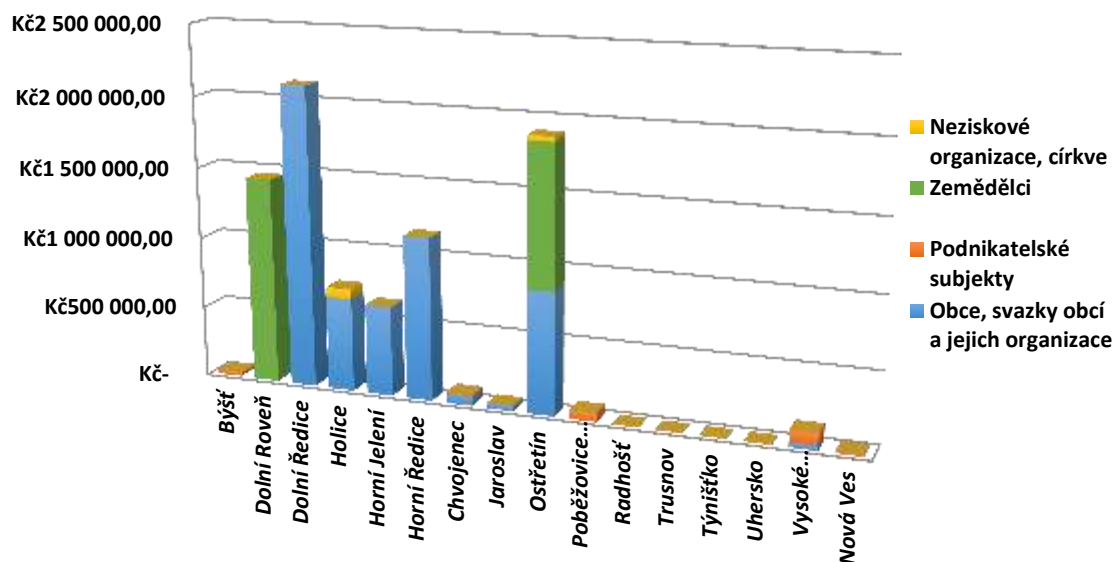

3. Věcný pokrok v plnění cílů strategie CLLD

Ve sledovaném období byly vyhlášeny výzvy a probíhal hodnotící a schvalovací proces žádostí o podporu. Žádný projekt nebyl ještě zrealizován. To je vidět i na plnění finančního a indikátorového plánu, které se ještě nezačaly plnit, případně jsou na úplném počátku svého plnění.

3.1. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce PRV

Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým Fichím Programového rámce PRV probíhalo následovně:

Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků: V 1-2/2017 probíhala výzva. Do 5/2017 probíhal hodnotící a schvalovací proces žádostí o dotaci na MAS, v rámci kterého byly vybrány 3 žádosti k financování. 31.5.2017 byly tyto žádosti předány na SZIF k závěrečnému hodnocení. Všechny předložené projekty byly dne 21.12.2017 schváleny SZIFem k financování. Jejich schválená výše dotace činila 3.046.578Kč.

Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků: Tato Fiche byla v plánu vyhlásit až v rámci druhé vyhlášené výzvy MAS. Proto v roce 2017 probíhala pouze konzultace preferenčních kritérií se SZIF. Vyhlášení nejbližší výzvy je plánováno na 1-2/2018.

Fiche 3 – Podpora malých podniků: V 1-2/2017 probíhala výzva. Žádný projekt se nepřihlásil, a to i přes několik konzultací s potencionálními žadateli (probíhaly před i v průběhu výzvy). Vyhlášení další nejbližší výzvy je plánováno na 1-2/2018. Tomu předcházelo i několik propagačních akcí (zveřejnění tiskové zprávy v Holických listech, Zpravodaji Agrovenkova, na webu www.holicko.cz a žádost starostům obcí o předání zprávy podnikatelům z jejich území).

Fiche 4 – Ochrana lesních porostů: V 1-2/2017 probíhala výzva. Do 5/2017 probíhal hodnotící a schvalovací proces žádostí o dotaci na MAS, v rámci kterého byla vybrána 1 žádost k financování. 31.5.2017 byla žádost předána na SZIF k závěrečnému hodnocení. A tato žádost byla dne 16.10.2017 schválena SZIFem k financování. Její schválená výše dotace činila 195.111Kč. 8.11.2017 žadatel podepsal Dohodu o poskytnutí dotace na SZIF.

Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům: Tato Fiche byla v plánu vyhlásit až v rámci druhé vyhlášené výzvy MAS. Proto v roce 2017 probíhala pouze konzultace preferenčních kritérií se SZIF. Vyhlášení nejbližší výzvy je plánováno na 1-2/2018.

Fiche 6 – Spolupráce místních akčních skupin: Zatím jsou vyhledávána témata spolupráce s jinými MAS splňující podmínky opatření PRV 19.3.1

Tabulka 18 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce PRV k 31.12.2017

Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce PRV	1 - Podpora zemědělských podniků	2 - Podpora potravinářských podniků	3 - Podpora malých podniků	4 - Ochrana lesních porostů	5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům	6 - Spolupráce MAS	Celkem Programový rámec PRV
Finanční alokace pro celé období uvedené v SCLLD	4.931.207,00Kč	974.066,00Kč	4.748.569,00Kč	1.217.582,00Kč	304.395,00Kč	580.936,00Kč	12.756.755,00Kč
Vyhlášená alokace	1.631.207,00Kč	0Kč	1.648.569,00Kč	467.582,00Kč	0Kč	0Kč	3.747.358,00Kč
Počet podaných projektů	3	0	0	1	0	0	4

Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce PRV	1 - Podpora zemědělských podniků	2 - Podpora potravinářských podniků	3 - Podpora malých podniků	4 - Ochrana lesních porostů	5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům	6 - Spolupráce MAS	Celkem Programový rámec PRV
Výše požadované dotace (<i>Žádost o dotaci</i>)	3.048.328,00Kč	0Kč	0Kč	195.111,00Kč	0Kč	0Kč	3.243.439,00Kč
Počet podpořených projektů	3	0	0	1	0	0	4
Výše schválené dotace (Dohoda o poskytnutí dotace)	3.046.578,00Kč	0Kč	0Kč	195.111,00Kč	0Kč	0Kč	3.241.689,00Kč
Celkové výdaje podpořených projektů (<i>Žádost o proplacení</i>)	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč
Výše proplacené dotace	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč
Výše sankcí a korekcí	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč
Celkem závazkováno z opatření PRV 19.2.1 a 19.3.1 (proplacená dotace + sankce)	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč	0Kč

3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce PRV

Ve sledovaném období probíhal pouze hodnotící a schvalovací proces žádostí o podporu. Žádný projekt nebyl ještě realizován, tzn. nebyla podána žádná průběžná, natož pak závěrečná zpráva o realizaci projektu.

3.1.2. Plnění finančního plánu Programového rámce PRV

Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD MAS Holicko není plněn. A to i přes to, že v rámci první vyhlášené výzvy programového rámce PRV byly vyhlášeny všechny Fiche, které byly plánovány, a finanční alokace výzvy byla pro plnění plánu dostatečná.

Důvodů je hned několik. Prvním z nich je, že v roce 2016 nebylo možné vyhlásit výzvu, protože se čekalo na zveřejnění nových Pravidel PRV. MAS Holicko vyhlásilo výzvu ihned, jakmile to bylo možné, tj. výzva pro programový rámec PRV byla vyhlášena 3.1.2017. Přesto projekty, které musely dodat výběrové řízení (všechny projekty z Fiche 1) ještě před započítáním závěrečné kontroly na SZIF, byly SZIFem schváleny až v 12/2017, tj. sice v roce 2017, ale až po rozhodném datu (31.10.2017), kdy se mají zapisovat údaje do tabulky daného roku.

Dalším důvodem je, že nebyla plně vyčerpána alokace výzvy a navíc do Fiche 3 nebyla podána žádná žádost o dotaci, a to i přes několik konzultací s potencionálními žadateli (probíhaly před i v průběhu výzvy). Předpokládáme, že to bylo tím, že se jednalo o první výzvu, tj. že projektová připravenost žadatelů byla nižší, a nestačili zareagovat na vyhlášenou výzvu (např. k žádosti dotaci je zapotřebí již platné a pravomocné stavební povolení). Na základě obdobných zkušeností velkých operačních programů s plněním alokací jejich výzev nebo vlastních zkušeností z minulého programového období s realizací SPL 2007 – 2013, očekáváme v dalších letech postupný vzestup počtu žadatelů. Přesto jsme již zahájili realizaci potřebných protipatření – zvýšili jsme propagaci SCLLD MAS Holicko v území

(zveřejnění tiskové zprávy v Holických listech, Zpravodaji Agrovenkova, na webu www.holicko.cz a žádost starostům obcí o předání zprávy podnikatelům z jejich území).

Tabulka 19 – Plnění finančního plánu Programového rámce PRV v roce 2017 uvedeného v SCLLD

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – ROK 2017						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
1. Podpora zemědělských podniků	2.191,65	821,87	273,96	0,00	1.095,82	
2. Podpora potravinářských podniků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Podpora malých podniků	2.435,16	821,87	273,96	0,00	1.339,34	
4. Ochrana lesních porostů	487,03	182,64	60,88	0,00	243,52	
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Spolupráce místních akčních skupin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ V ROCE 2017						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
1. Podpora zemědělských podniků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Podpora potravinářských podniků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Podpora malých podniků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Ochrana lesních porostů	390,22	124,87	70,24	0,00	195,11	81,95
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Spolupráce místních akčních skupin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – ROK 2017						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
1. Podpora zemědělských podniků	-2.191,65	-821,87	-273,96	-	-1.095,82	-
2. Podpora potravinářských podniků	-	-	-	-	-	-
3. Podpora malých podniků	- 2.435,16	- 821,87	- 273,96	-	- 1.339,34	-
4. Ochrana lesních porostů	- 96,81	- 57,77	+9,36	-	- 48,41	+81,95
5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	-	-	-	-	-	-
6. Spolupráce místních akčních skupin	-	-	-	-	-	-

*Veškeré částky (v tis. Kč) jsou v případě Programového rámce PRV počítány ze Žádostí o dotaci schválených SZIF do 31.10.2017

3.1.3. Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV

V roce 2017 nebyla ukončena realizace žádného projektu, tzn. že nebyly plněny žádné indikátory programového rámce PRV.

Tabulka 20 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce PRV uvedeného v SCLLD

	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD		SKUTEČNOST		
	Milník 31.12.2018	Cílová hodnota	2016	2017	Celkem
Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků					
Počet podpořených podniků / příjemců	1	5	0	0	0
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	1	0	0	0
Fiche 2 - Podpora potravinářských podniků					
Počet podpořených podniků/příjemců	0	2	0	0	0
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	0	0	0
Fiche 3 - Podpora malých podniků					
Počet podpořených podniků / příjemců	2	8	0	0	0
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	1	0	0	0
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů					
Počet podpořených operací (akcí)	1	5	0	0	0
Celková plocha (ha)	11	55	0	0	0
Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům					
Počet podpořených operací (akcí)	0	1	0	0	0
Celková plocha (ha)	0	50	0	0	0
Fiche 6 - Spolupráce místních ačnických skupin					
Celkové veřejné výdaje (O.1)	0	21.478	0	0	0

3.2. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP

Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce IROP probíhalo následovně:

Opatření 1. – Vzdělávání: V 4-6/2017 probíhala výzva. Do 11/2017 probíhal hodnotící a schvalovací proces žádostí o podporu na MAS, v rámci kterého byla vybrána 1 žádost k financování. 9.11.2017 byla tato žádost předána na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Opatření 2. – Bezpečnost silničního provozu: V 4-6/2017 probíhala výzva. Do 11/2017 probíhal hodnotící a schvalovací proces žádostí o podporu na MAS, v rámci kterého byly vybrány 4 žádosti k financování. 9.11.2017 byly tyto žádosti předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Tabulka 21 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP k 31.12.2017

Věcný pokrok v plnění cílů programového rámce IROP	1 - Vzdělávání	2 – Bezpečnost silničního provozu	Celkem Programový rámec IROP
Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD	15.165.805,00Kč	8.166.203,00Kč	23.332.008,00Kč
Vyhlášená alokace	3.066.203,00Kč	6.365.805,00Kč	9.432.008,00Kč
Počet podaných projektů	1	5	6
Výše požadované dotace (<i>Žádost o podporu</i>)	1.042.884,81Kč	4.022.890,80Kč	5.065.775,61Kč
Počet podpořených projektů	1	4	5
Výše schválené dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)	OKč	OKč	OKč
Celkové výdaje podpořených projektů (<i>Žádost o proplacení</i>)	OKč	OKč	OKč
Výše proplacené dotace	OKč	OKč	OKč
Výše sankcí a korekcí	OKč	OKč	OKč
Celkem závazkováno z opatření IROP 4.1 (proplacená dotace + sankce)	OKč	OKč	OKč

3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP

Ve sledovaném období probíhal pouze hodnotící a schvalovací proces žádostí o podporu. Žádný projekt nebyl ještě realizován, tzn. nebyla podána žádná průběžná, natož pak závěrečná zpráva o realizaci projektu.

3.2.2. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP

Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD MAS Holicko je plněn. A to z důvodu toho, že se při jeho tvorbě neočekávalo, že by některý projekt mohl podat žádost o proplacení do 31.10.2017.

Na druhou stranu již teď víme, že problém s plněním nastane již příští rok. Jedním důvodem je, že nebyly plně vyčerpány alokace obou výzev (pouze cca polovina). Stejně jako u programového rámce PRV předpokládáme postupný nárůst počtu přijatých žádostí v jednotlivých letech, tak jak si žadatelé budou stačit připravovat potřebné přílohy (např. projektová dokumentace, stavební povolení).

Dalším důvodem je to, že pouze 1 projekt ze 4 schválených má v plánu podat žádost o platbu do rozhodného data, tj. do 31.10.2018. A bohužel toto nemůžeme nijak ovlivnit, realizace projektů je naplánována dle možností žadatelů (nejbližší jarní a letní měsíce) a většinou ji již nejde více urychlit. Navíc všechny schválené projekty musí k žádosti o platbu dodat kolaudační souhlas, což dobu realizace také prodlužuje.

Tabulka 22 – Plnění finančního plánu Programového rámce IROP v roce 2017 uvedeného v SCLLD

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – ROK 2017						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
1. Vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ V ROCE 2017						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
1. Vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – ROK 2017						
Opatření/Fiche SCLLD	PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
		Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
1. Vzdělávání	-	-	-	-	-	-
2. Bezpečnost silničního provozu	-	-	-	-	-	-

*Veškeré částky (v tis. Kč) jsou v případě Programového rámce IROP počítány ze žádostí o platbu podaných na CRR do 31.10.2017

3.2.3. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP

V roce 2018 nebyla ukončena realizace žádného projektu, tzn. že nebyly plněny žádné indikátory programového rámce IROP.

Tabulka 23 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD

	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD		SKUTEČNOST		
	Milník 31.12.2018	Cílová hodnota	2016	2017	Celkem
Opatření 1 – Vzdělávání					
Počet podpořených vzdělávacích zařízení	1	5	0	0	0
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	-	180	0	0	0

	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD		SKUTEČNOST		
	Milník 31.12.2018	Cílová hodnota	2016	2017	Celkem
Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu					
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	-	6	0	0	0

3.3. Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce

Ihned po ukončení sledovaného období bylo provedeno šetření na území Holicka o naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko, které si stanovila MAS mimo programové rámce PRV a IROP.

Počátkem 1/2017 byli osloveni všichni starostové obcí z územní působnosti MAS, členové MAS a další aktéři z území, jež má MAS ve své adresáři se žádostí o vyplnění údajů do vytvořeného dotazníku. Ten byl zaměřen na zjištění počtu projektů, které se na Holicku ve sledovaném období realizovaly. Mohlo se jednat o projekty realizované z evropských fondů, národních dotací, dotací Pardubického kraje nebo i třeba z vlastních zdrojů.

Přestože návratnost dotazníků byla malá (odpovědělo pouze 17 respondentů), tak výsledky odpovídají původním předpokladům, tj. počet zrealizovaných projektů v území je na cca 2/3 (64%) plnění indikátorů stanovených k milníku (31.12.2018). To znamená, že v příštím roce (poslední rok do konce milníku) je potřeba naplnit ještě 1/3.

O trochu hůř je na tom, ale pohled podle realizace projektů v rámci jednotlivých opatření SCLLD. Některé jsou totiž plněny více, některé méně než byl předpoklad a některé dokonce vůbec. Problém tkví hlavně v malé návratnosti dotazníku, složení respondentů (převážně obce, málo místní spolky, téměř žádní podnikatelé) a také v pochopení termínu „projekt“. Ze získaných odpovědí totiž většina respondentů oznamovala pouze realizaci projektů, které byly hrazeny z dotace. Projekty hrazené z rozpočtu respondentů nebyly oznamovány téměř vůbec, natož pak nějaké neinvestiční, popřípadě „měkké“ aktivity. Toto bude potřeba v příštích letech odstranit (zlepšit popis v dotazníku), abychom pokud možno dostávali reálná data, které budou popisovat skutečný směr rozvoje území.

Výstupy z provedeného šetření jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tabulka 24 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2017 – Klíčová oblast A. Partnerská spolupráce

Název opatření	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD			SKUTEČNOST		Celkem
	Výchozí hodnota	Milník 31.12.2018	Cílová hodnota	2016	2017	
Opatření: A.1.1.1 Aktivní tvorba dostatečného prostoru na setkávání, navazování kontaktů a spolupráci nejrůznějších subjektů ať již vně, či uvnitř jednotlivých sektorů a zájmových skupin místního partnerství						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	1	1	1	1	2
Počet vytvořených partnerství v rámci regionu MAS Holicko	1	1	2	0	1	1
Opatření: A.1.2.1 Přenos zkušeností a aktivní spolupráce na regionální, národní i mezinárodní úrovni						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	1	2	4	4	8

Počet vytvořených partnerství s aktéry mimo území MAS Holicko	1	2	3	0	1	1
92501 - Celkové veřejné výdaje (O.1) (EUR)	0	0	21 478	0	0	0
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti A celkem	0	2	3	5	5	10

V rámci klíčové oblasti A. Partnerská spolupráce jsou indikátory naplňovány lépe, než bylo při tvorbě strategie očekáváno (500%). Důvodem je, že projekty založené na spolupráci několika jiných subjektů, ať již na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni realizovaly i jiné subjekty v území než pouze MAS Holicko (Dobrovolný svazek obcí Holicka, Rodinné centrum Holoubek a ZUŠ Karla Malicha).

V případě regionálního partnerství bylo jako výchozí hodnota 1 bráno, to že v roce 2007 vznikla díky spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru MAS Holicko, o.p.s. Ve sledovaném období bylo na území Holicka vytvořeno partnerství MŠ, ZŠ, jejich zřizovatelů a případných dalších subjektů zabývajících se vzděláváním v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP).

V případě nadregionálního partnerství byla výchozí hodnotou spolupráce z roku 2013, kdy MAS Holicko s MAS Region Kunětická hora, MAS Bohdanečsko a Městem Pardubice začali spolupracovat na regionálním značení místních výrobků s názvem „Kraj Pernštejnů“. V roce 2017 tyto subjekty a navíc MAS Železnohorský region založily turistickou oblast s názvem „Pardubicko – Perníkové srdce Čech“.

Co se týče indikátoru Celkové veřejné výdaje – jedná se o výši projektů MAS Holicko podpořených z PRV opatření 19.3.1. Ve sledovaném období MAS Holicko prozatím nepodala do tohoto opatření žádnou projektovou žádost.

Tabulka 25 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2017 – Klíčová oblast B. Kvalitní život v obcích

Název opatření	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD			SKUTEČNOST		Celkem
	Výchozí hodnota	Milník 31.12.2018	Cílová hodnota	2016	2017	
Opatření: B.1.1.1 Obnova a kultivace veřejných prostranství a center obcí						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	22	60	6	7	13
Opatření: B.1.1.2 Rozvoj komunitních služeb a vybavenosti obcí						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	3	10	1	2	3
Opatření: B.1.1.3 Podpora školství a celoživotního vzdělávání						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	22	60	9	12	21
50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0	1	5	0	0	0
50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení	0	-	180	0	0	0

50030 - Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40%	-	5,00%	0	0	0
Opatření: B.1.1.4 Podpora sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin občanů do života v obcích a v regionu						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	3	10	1	1	2
Opatření: B.2.1.1 Volnočasové aktivity a spolkový život						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	11	30	1	2	3
Opatření: B.2.1.2 Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	22	60	3	2	5
Opatření: B.3.1.1 Rozvoj technické infrastruktury						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	7	20	0	1	1
Opatření: B.3.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	11	30	3	3	6
Opatření: B.3.1.3 Dopravní dostupnost a obslužnost regionu						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	1	5	1	0	1
Opatření: B.4.1.1 Podpora bezpečnosti silničního provozu a rozvoj cyklodopravy v obcích regionu						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	7	20	6	4	10
75001 - Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0	-	6	0	0	0
75120 - Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30%	-	35%	0	0	0
Opatření: B.4.1.2 Zlepšení dohledu nad veřejným pořádkem						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	1	5	0	0	0
Opatření: B.4.1.3 Protipovodňová a požární prevence						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	7	20	0	1	1
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti B celkem						
	0	117	330	31	35	66

V rámci klíčové aktivity B. Kvalitní život v obcích jsme na přibližně polovině plnění indikátorů stanovených k milníku (31.12.2018). Nejvíce zrealizovaných projektů je z opatření zaměřených na školství, veřejná prostranství, dopravní infrastrukturu a bezpečnost silničního provozu. Naopak nejméně projektů bylo z opatření zaměřených na volnočasové aktivity a spolkový život. Určitě ale není pravdou, že by se v území spolkový život nepodporoval. Problém tkví spíše v malé návratnosti dotazníku, složení respondentů (převážně obce, málo místní spolky, téměř žádní podnikatelé) a také v pochopení termínu „projekt“. Ze získaných odpovědí totiž většina respondentů oznamovala pouze realizaci projektů, které byly hrazeny z dotace. Projekty hrazené z rozpočtu respondentů nebyly oznamovány téměř vůbec, natož pak nějaké neinvestiční, popřípadě „měkké“ aktivity.

Tabulka 26 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2017 – Klíčová oblast C. Podpora podnikání a zaměstnanosti

Název opatření	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD			SKUTEČNOST		Celkem
	Výchozí hodnota	Milník 31.12.2018	Cílová hodnota	2016	2017	
Opatření: C.1.1.1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	5	15	3	0	3
93701 - Počet podpořených podniků / příjemců	0	1	5	0	0	0
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	1	0	0	0
Opatření: C.1.1.2 Podpora lesního hospodářství						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	3	10	0	3	3
92702 - Počet podpořených operací	0	1	6	0	0	0
93001 - Celková plocha (ha)	0	11	105	0	0	0
Opatření: C.1.2.1 Podpora drobného podnikání, rozvoje služeb a tradičních řemesel						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	5	20	0	0	0
93701 - Počet podpořených podniků / příjemců	0	2	10	0	0	0
94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	1	0	0	0
Opatření: C.1.2.2 Podpora regionálních produktů, řemesel a služeb včetně jejich propagace						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	0	1	0	0	0
Opatření: C.2.1.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělanosti v souladu s potřebami regionu						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	0	1	1	1	2
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti C celkem						
	0	13	47	4	4	8

V rámci klíčové aktivity C. Podpora podnikání a zaměstnanosti jsme na přibližně 60% plnění indikátorů stanovených k milníku (31.12.2018). Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na zemědělské podnikání, lesní hospodářství a podporu zaměstnanosti. Žádný projekt se netýkal drobných nezemědělských podnikatelů. Důvod je víceméně stejný jako u předchozí klíčové aktivity. Drobné podnikání na Holicku se určitě rozvíjí, problém byl ale ve složení respondentů (převážně obce, málo místní spolky, téměř žádní podnikatelé) a také v pochopení termínu „projekt“. Ze získaných odpovědí totiž většina respondentů oznamovala pouze realizaci projektů, které byly hrazeny z dotace. Projekty hrazené z rozpočtu respondentů nebyly oznamovány téměř vůbec, natož pak nějaké neinvestiční, popřípadě „měkké“ aktivity.

Tabulka 27 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2017 – Klíčová oblast D. Rozvoj cestovního ruchu

Název opatření	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD			SKUTEČNOST		Celkem
	Výchozí hodnota	Milník 31.12.2018	Cílová hodnota	2016	2017	
Opatření: D.1.1.1 Infrastruktura pro cestovní ruch (rozhledny, pěší stezky, naučné stezky, půjčovny sportovních potřeb, servis, apod.)						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	1	5	0	1	1
Opatření: D.1.1.2 Podpora turisticky a historicky významných objektů						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	5	15	1	0	1
Opatření: D.1.2.1 Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit v oblasti venkovské turistiky						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	1	3	0	0	0
Opatření: D.1.2.2 Podpora cykloturistiky						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	1	3	0	0	0
Opatření: D.2.1.1 Podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	0	1	0	0	0
Opatření: D.2.1.2 Propagace regionu (i mimo jeho území) a v něm působících subjektů						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	0	1	0	1	1
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti D celkem	0	8	28	1	1	3

V rámci klíčové aktivity D. Rozvoj cestovního ruchu jsme na přibližně 40% plnění indikátorů stanovených k milníku (31.12.2018). Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na infrastrukturu cestovního ruchu, podporu historicky významných objektů a propagaci regionu. Žádný projekt se netýkal rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit, cykloturistiky a informačních center. Důvod je víceméně stejný jako u předchozích klíčových aktivit. Cestovní ruch se určitě rozvíjí, problém byl ale ve složení respondentů (převážně obce, málo místní spolky, téměř žádní podnikatelé) a také v pochopení termínu „projekt“. Ze získaných odpovědí totiž většina respondentů oznamovala pouze realizaci projektů, které byly hrazeny z dotace. Pro Projekty hrazené z rozpočtu respondentů nebyly oznamovány téměř vůbec, natož pak nějaké neinvestiční, popřípadě „měkké“ aktivity.

Tabulka 28 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo programové rámce k 31.12.2017 – Klíčová oblast E. Životní prostředí

Název opatření	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD			SKUTEČNOST		Celkem
	Výchozí hodnota	Milník 31.12.2018	Cílová hodnota	2016	2017	
Opatření: E.1.1.1 Zachování a obnova krajinných hodnot a přírodního dědictví						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	1	5	0	1	1

Opatření: E.1.1.2 Udržitelné obhospodařování krajiny						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	0	2	0	0	0
Opatření: E.1.1.3 Zlepšování vodního režimu v krajině a hospodaření s vodou						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	0	2	0	0	0
Opatření: E.2.1.1 Zkvalitnění hospodaření s odpady						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	1	3	2	1	3
Opatření: E.2.1.2 Revitalizace černých skládek a zátěží						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	0	2	0	0	0
Opatření: E.3.1.1 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	0	2	0	0	0
Opatření: E.3.1.2 Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování veřejnosti v oblasti životního prostředí						
Počet realizovaných projektů v rámci opatření	0	0	2	0	0	0
Počet realizovaných projektů v rámci Klíčové oblasti E celkem						
	0	2	18	2	2	4

V rámci klíčové aktivity D. Rozvoj cestovního ruchu jsou indikátory naplňovány lépe, než bylo při tvorbě strategie očekáváno (200%). Důvodem je to, že původně bylo odhadováno plnění v rámci jednotek (2 projekty), tudíž i když se zrealizovali ve sledovaném období pouze 4 projekty, tak procentní překročení plánovaného plnění je veliké.

Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na zachování a obnovu krajinných hodnot a hospodaření s odpady, tj. všude tam, kde jsme předpokládali plnění k milníku (31.12.2018).

3.4. Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie

Vzhledem k tomu, že realizace SCLLD je teprve na začátku a zatím nebyl dokončen žádný dílčí projekt, nebylo dosud dosaženo žádných synergických efektů.

3.5. Horizontální principy

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla zahájena fyzická realizace dílčích projektů v rámci SCLLD, není možné ani hovořit o plnění horizontálních principů. Na druhou stranu v rámci právě probíhajícího hodnocení projektů jsou podpořeny pouze ty projekty, jež mají pozitivní nebo alespoň neutrální vliv na horizontální témata. Navíc jsou bodově zvýhodňovány ty projekty, jež mají pozitivní vliv na horizontální témata (především udržitelný rozvoj).

4. Animace strategie CLLD

Animační aktivity MAS jsou všechny činnosti MAS v rámci SCLLD, které nezahrnují vyhlášení výzev a administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o používané komunikační strategie a z nich vycházející komunikační aktivity, které slouží k informování veřejnosti o SCLLD, dále k přenosu informací ke konkrétním žadatelům či zájemcům o podání žádosti o podporu v rámci SCLLD, podpoře žadatelů při realizaci svých projektů či nastavení celkových procesů toku informací mezi všeobecnou veřejností, zájemci, žadateli a dalšími aktéry na území.

V roce 2016 byla uspořádána konference s názvem „Co Vám nabízí MAS Holicko a její Strategie v letech 2016 – 2023“ (3.10.2016) a informativní seminář pro školy na území Holicka (27.6.2016) týkající se šablon I.

V roce 2017 byla uspořádána konference s názvem „Co Vám nabízí MAS Holicko a její Strategie v letech 2016 – 2023“ (17.10.2016) a 3 semináře v rámci výzev MAS (11.1.2017, 16.1.2017 a 2.5.2017).

Tabulka 29 – Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

	INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD	SKUTEČNOST		
	Cílová hodnota	2016	2017	Celkem
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	25	2	4	6

Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitolách níže.

4.1. Propagace strategie CLLD

Ve sledovaném období bylo cílem informovat území o tom, že MAS Holicko začalo realizovat SCLLD a také všechny potenciální předkladatele projektů seznámit se zaměřením jednotlivých opatření a s pravidly administrace. Pro toto období byly voleny následující prostředky propagace:

- **Webové stránky** MAS Holicko (www.holicko.cz) – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD.
- **Stručný leták** o SCLLD v nákladu 2.000ks – představení jednotlivých fichí a opatření obou programových rámců. Materiál byl distribuován všem partnerům MAS a klíčovými aktéry z území, na všechny obecní úřady a všem potenciálním zájemcům o podporu z adresáře MAS a účastníkům vzdělávacích, kulturních a propagačních akcí, které MAS Holicko organizovala nebo zde prezentovala svou činnost.
- **Roll-up** se základními informacemi o MAS a realizaci SCLLD – využíván na různých propagačních nebo vzdělávacích akcích pořádaných MAS nebo jednání povinných orgánů.
- **Vizitky** manažerů pro SCLLD – rozdávány jak na osobních konzultacích, tak i na kulturních, propagačních a vzdělávacích akcích, kterých se pracovníci MAS účastní.
- **Propagační předměty** (blok, propiska, papírové desky, reflexní pásek) – rozdávány na kulturních, propagačních a vzdělávacích akcích.

- **Zpravodaj MAS Holicko** (září 2016, únor 2017 a září 2017) – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD. Distribuce probíhá prostřednictvím partnerů MAS a obecních úřadů na území MAS a dále na webu MAS.
- **Výroční zpráva MAS Holicko** za rok 2016 – zveřejnění výsledků, kterých bylo za příslušný rok dosaženo.
- **Tiskové zprávy** – Holické listy (7/2016, 9/2016, 12/2017) a Zpravodaj Agrovenkova (8/2016, 12/2017) – informace o výzvách a realizaci SCLLD.
- **Rozesílání důležitých informací do e-mailových schránek** partnerům MAS, klíčovému aktérům z území MAS a všem subjektům, které má MAS v adresáři – informace o vyhlášení výzvy a jejich důležitých milnících (např. přijaté žádosti o podporu, schválené žádosti o podporu, apod.)
- **Účast na kulturních a propagačních akcích** – Dny Holicka 2016 (25.-26.6.2016) a Dny Holicka 2017 (24.-25.6.2017) – prezentace realizace SCLLD na Holicku.
- **Pořádání seriálu konferencí s názvem „Co Vám nabízí MAS Holicko a její Strategie v letech 2016 – 2023“** (3.10.2016, 17.10.2017) – Zde se se přítomní dozvěděli o Strategii CLLD a o jejich jednotlivých opatřeních.

4.2. Podpora žadatelů

Telefonické, e-mailové a osobní konzultace s pracovníky MAS. – Konečným žadatelům, resp. příjemcům je poskytnuta podpora ze strany pracovníků MAS. Žadatelům jsou zprostředkovávány přes pracovníky MAS informace z řídicích orgánů a naopak. Na druhou stranu pracovníci MAS u příjemců zjišťují informace o průběhu realizace projektu a reagují na možné problémy.

Příručky pro žadatele – Manažerky MAS zpracovaly pro každou vyhlášenou Fichi / opatření samostatnou Příručku pro žadatele. V nich žadatel najde informace jak vyplnit žádost o podporu, seznam povinných a nepovinných příloh, seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů, kritéria hodnocení přijatelnosti, bodovací tabulky a další důležité informace související se zpracováním projektů. Příručky jsou zveřejněny vždy u konkrétní výzvy nebo jsou rozdávány vytištěné na seminářích pořádaných MAS.

Pořádání seminářů pro žadatele v rámci každé výzvy – V rámci výzvy č. 2 – PRV se konaly semináře 11.1.2017 v Holicích a 16.1.2017 v Ostřetině. V rámci výzev č.1 a 2 – IROP se konaly semináře 2.5.2017 v Dolních Ředvicích a 11.5.2017 v Holicích. Bohužel semináře 11.5.2017 se nikdo ze žadatelů nezúčastnil.

4.3. Animace školských zařízení v OPVVV

V průběhu sledovaného období také samozřejmě probíhala animace školských zařízení v OP VVV, v rámci které manažerky MAS poskytují školám **konzultace (telefonické, e-mailové a osobní)**, zprostředkovávají kontakt s MŠMT, pomáhají se založením žádosti o dotaci, oznámením změny, žádostí o proplacení, jejím vyplněním a odesláním.

Kromě toho 27.6.2016 byl pořádán **informativní seminář pro školy na území Holicka**, kde účastníci získali přehled o nabízených šablonách.

4.4. Vzdělávání zaměstnanců a partnerů MAS

Ve sledovaném období se manažerky MAS **zúčastnily 18 školení (workshopy, konference) věnovaných realizaci CLLD:**

- Workshop „S MAS k nástroji CLLD uplatňovaném v programovém období 2014—2020“ pořádaný MMR dne 20.9.2016 v Praze,
- Workshop „Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru“ pořádaný NS MAS ČR dne 4.10.2016 v Letohradě,
- Konference Venkov 2016 ve dnech 20. - 21.10.2016 v Litoměřicích,
- Workshop „Učíme se spolupracovat“ pořádaný CSV ve dnech 9. - 10.11.2016 v Poříčí u Litomyšle,
- Konference „Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru“ pořádaný NS MAS ČR dne 23.11.2016 ve Dvoře Králové nad Labem,
- Školení uživatelů CSSF14+ v oblasti „Specifikace výzev IN, Hodnocení integrovaných projektů“ pořádaný NS MAS ČR dne 10.2.2017 v Proseči,
- Akce „Setkání Celostátní sítě pro venkov na téma sdílení a výměna zkušeností Místních akčních skupin Pardubického kraje“ pořádaná CSV a MAS Holicko dne 27.4.2017 v Holicích,
- Konference LeaderFEST 2017 ve dnech 30.5. - 1. 6.2017 v Hlinsku,
- Workshop „Hodnocení integrovaných projektů v MS2014+“ pořádaný MMR dne 5.6.2017 v Praze,
- Akce „Setkání zástupců MAS a řídicích orgánů v Pardubickém kraji“ pořádaná NS MAS ČR dne 12.6.2017 v Pardubicích,
- Školení uživatelů CSSF14+ v oblasti „Hodnocení integrovaných projektů“ pořádaný NS MAS ČR dne 21.6.2017 v Proseči,
- Seminář ŘO IROP ke SC 4.1 pořádaný dne 24.7.2017 v Praze,
- Seminář k animaci škol 2017 pořádaný MŠMT dne 5.10.2017 v Praze,
- Seminář IROP pro příjemce 6. výzvy pořádaný CRR ČR dne 12.10.2017 v Praze,
- Exkurze „Rozvoj venkova v Libereckém kraji s podporou z Programu rozvoje venkova“ pořádaný MAS Orlicko a CSV ve dnech 18. - 19.10.2017,
- Konference Venkov 2017 ve dnech 1. - 3.11.2017 v Dřítči,
- Seminář „Veřejné zakázky“ pořádaný CSV dne 14.11.2017 ve Valticích,

- Akce „Sdílení zkušeností z implementace strategií komunitně vedeného místního rozvoje v Pardubickém kraji“ pořádaná CSV a MAS Litomyšsko ve dnech 30.11. - 1.12.2017 ve Vysokém Mýtě.

Dále ve sledovaném období probíhala **výměna zkušeností a poznatků**, a to především v rámci Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Obsahem společných setkání byly nejen informace z výboru a pracovních skupin NS MAS ČR, ale i informace k úpravám strategií v rámci připomínek od řídicích orgánů, přípravě a zkušenostem z vyhlášení výzev MAS v rámci jednotlivých programových rámců, příprava výzvy Malého LEADERu nebo výměna informací se zástupci z CSV, SZIF, CRR, MMR a Pardubického kraje. Součástí některých jednání byla i školení s příklady dobré praxe a představení směrů podpory v rámci operačních programů.

- 26.8.2016 Luže (interní postupy MAS, žádost o dotaci na režijní výdaje),
- 4.10.2016 Letohrad (projednání vstupu do Energeticky-technického inovačního klastru (ETIK), školení k tvorbě studií proveditelnosti),
- 2. - 3.11.2016 Inspirativní návštěva zástupců MAS Pardubického kraje u polských partnerů - Dolina Baryczy,
- 9.11.2016 Poříčí u Litomyše (zprávy z výboru, školení k administraci výzev PRV a IROP, seznámení se s webovými aplikacemi pro zadávání výzev, tvorba preferenčních kritérií a směrnic),
- 21.12.2016 Jevíčko (interní postupy MAS, ZoR a ŽoP na režijní výdaje, CSSF14+, administrace a monitoring projektů),
- 9.2.2017 Hlinsko (info z výboru a pracovních skupin NS MAS, stav vyjednávání OP, tvorba MAP),
- 5.4.2017 Bystré (info z výboru a pracovních skupin NS MAS, sociální služby v SCLLD MAS Pardubického kraje, tvorba MAP),
- 27.4.2017 Holice (info z výboru a pracovních skupin NS MAS, stav výzev MAS PK, příprava LeaderFESTu a Konference Venkov, MAP, CSV, SZIF),
- 12.6.2017 Pardubice (info z výboru a pracovních skupin NS MAS, Program obnovy venkova Pardubického kraje, CRR, MMR),
- 7.9.2017 Proseč (zkušenosti s přípravou, vyhlášením a hodnocením výzev IROP, PRV a OP Z, příprava výzev MAS - POV PK „Malý LEADER“),
- 2.10.2017 Luže (příprava výzev MAS – POV PK „Malý LEADER“, info z výboru a pracovních skupin NS MAS, tvorba MAP),
- 1.12.2017 Vysoké Mýto (info z výboru a pracovních skupin NS MAS, CSV, SZIF, CRR, MMR, Pardubický kraj, stav výzev MAS PK).

5. Informace o problémech a rizicích v průběhu realizace strategie CLLD

5.1. Informace o problémech, které se vyskytly v průběhu realizace SCLLD a přijatá opatření

V průběhu sledovaného období byly identifikovány následující problémy, který by mohly mít negativní vliv na realizaci SCLLD:

1) Zpožděný harmonogram čerpání SCLLD – neplnění finančního a indikátorového plánu

V roce 2016 nebylo možné vyhlásit výzvu ani v jednom programovém rámci. V případě PRV se čekalo na zveřejnění nových Pravidel, v případě IROP byl problém v MS2014+ a ve dlouhých lhůtách schvalování interních postupů, výzev, apod. Proto MAS Holicko vyhlásila výzvy ihned, jakmile to bylo možné, tj. až na počátku roku 2017.

Výzva pro programový rámec PRV byla vyhlášena 3.1.2017. Přesto projekty, které musely dodat výběrové řízení ještě před započítáním závěrečné kontroly na SZIF (všechny projekty z Fiche 1), byly SZIFem schváleny až v 12/2017, tj. sice v roce 2017, ale až po rozhodném datu (31.10.2017), kdy se mají zapisovat údaje do tabulky finančního plánu daného roku.

Výzvy pro programový rámec IROP byly vyhlášeny v polovině 4/2017. Zde je zatím finanční plán plněn. A to z důvodu toho, že se při jeho tvorbě neočekávalo, že by některý projekt mohl podat žádost o proplacení do 31.10.2017. Na druhou stranu již teď víme, že problém s plněním nastane již příští rok. A to proto, že pouze 1 projekt z 5 schválených má v plánu podat žádost o platbu do rozhodného data. Tuto situaci bohužel nemůžeme nijak ovlivnit, realizace projektů je naplánována dle možností žadatelů (nejbližší jarní a letní měsíce) a většinou ji již nejde urychlit. Navíc všechny schválené projekty musí k žádosti o platbu dodat kolaudační souhlas, což dobu realizace také prodlužuje.

Opatření: MAS Holicko vyhlásilo výzvy ihned, jakmile to bylo možné, tj. na počátku roku 2017. Finanční alokace jednotlivých výzev byla vždy tak vysoká, aby MAS Holicko plnila finanční plán uvedený ve strategii CLLD. Takto hodlá pokračovat i v roce 2018, tj. vyhlásit výzvy v první polovině roku s dostatečnou finanční alokací.

2) Nedostatek žadatelů při výzvách MAS – neplnění finančního a indikátorového plánu

Ve všech výzvách MAS bylo přijato méně žádostí o dotaci, než byla finanční alokace daných výzev. Navíc do Fiche 3 programového rámce PRV nebyla podána žádná žádost o dotaci, a to i přes několik konzultací s potencionálními žadateli (probíhaly před i v průběhu výzvy). Předpokládáme, že to bylo tím, že se jednalo o první výzvy, tj. že projektová připravenost žadatelů byla nižší, a nestačili zareagovat na vyhlášené výzvy (např. k žádosti dotaci je zapotřebí již platné a pravomocné stavební povolení). Na základě obdobných zkušeností velkých operačních programů s plněním alokací jejich výzev nebo vlastních zkušeností z minulého programového období s realizací SPL 2007 – 2013, očekáváme v dalších letech postupný vzestup počtu žadatelů.

Opatření: Zvýšení propagace realizace SCLLD MAS Holicko v území. V 12/2017 (před vyhlášením výzvy programového rámce PRV) byly zveřejněny tiskové zprávy v Holických listech, Zpravodaji Agrovenkova, na webu www.holicko.cz a také byla poslána žádost starostům obcí o předání této

zprávy podnikatelům z jejich území.

5.2. Informace o potenciálních rizicích realizace SCLLD a opatření k jejich eliminaci

1) Neplnění finančního plánu – zpožděný harmonogram čerpání SCLLD a nedostatek žadatelů při výzvách MAS

Popis rizika a přijatá opatření viz kapitola 5.1 *Informace o problémech, které se vyskytly v průběhu realizace SCLLD a přijatá opatření*

2) Neplnění indikátorového plánu – zpožděný harmonogram čerpání SCLLD a nedostatek žadatelů při výzvách MAS

Popis rizika a přijatá opatření viz kapitola 5.1 *Informace o problémech, které se vyskytly v průběhu realizace SCLLD a přijatá opatření*

6. Závěr

Hlavním cílem této zprávy bylo zhodnotit současnou situaci naplňování strategie CLLD v prvním roce a půl její realizace, tj. od 18. 8. 2016 do 31. 12. 2017. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotného hodnocení byly vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i přijaté a zrealizované projekty. Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.

Protože se jedná teprve o počátek realizace strategie CLLD, která bude probíhat až do roku 2023, tak můžeme vidět, že finanční a indikátorový plán se ještě nezačaly plnit, případně jsou na úplném počátku svého plnění. Důvodem je to, že ve sledovaném období byly pouze vyhlášovány výzvy a probíhal hodnotící a schvalovací proces žádostí o podporu. Žádný projekt nebyl ještě zrealizován.

V průběhu sledovaného období byly identifikovány problémy, jako je zpožděný harmonogram čerpání SCLLD oproti původnímu předpokladu a nedostatek žadatelů při výzvách MAS, což v sobě nese rizika v podobě neplnění finančního a indikátorového plánu, a to hlavně vůči blížícímu se milníku (31.10.2018 / 31.12.2018). Manažerky MAS, aniž by čekaly na výsledky této hodnotící zprávy, provedly již opatření na konci roku 2017, a to v podobě vydání tiskových zpráv do místních zpravodajů a zaslání žádosti starostům obcí o předání této právy místním podnikatelům.

Proto **Kontrolní výbor MAS Holicko navrhuje tato opatření, která povedou ke zlepšení naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko:**

- **Nepřetržitá propagace SCLLD v území** (tiskové zprávy v místních zpravodajích a prostřednictvím starostů obcí, kteří mohou dávat doporučení místním organizacím, realizace workshopů, apod.),
- **Vyhlášení výzev MAS Holicko v první polovině roku 2018 s dostatečnou finanční alokací**, tak aby mohlo být podpořeno co nejvíce projektů a MAS se alespoň přiblížila plánovaným hodnotám.

Z pohledu potřebnosti se obsah strategie CLLD v tuto chvíli jeví jako dostatečný. Z konzultací se žadateli (konference, workshopy, osobní konzultace) vyplynulo, že současné nastavení programových rámců PRV a IROP je vyhovující.

Kromě toho MAS Holicko využila aktualizace Programu obnovy venkova Pardubického kraje, díky níž bylo možné prostřednictvím MAS podpořit malé projekty zaměřené na občanskou vybavenost obcí regionu. MAS Holicko tedy v 10/2017 vyhlásila výzvu „Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018“, která pomohla podpořit projektové záměry, které jsou sice uvedeny ve strategii, ale nemohly být podpořeny přímo z programových rámců PRV a IROP.

V rámci tohoto tématu (občanská vybavenost obcí), ale poptávka silně překračuje nabídku, a proto již 29.11.2017 Valná hromada MAS Holicko přijala usnesení č. 15/2017:

„Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje rozšíření programového rámce PRV o článek 20, s tím že nově přidané Fiche by sloužili jako rezerva v případě, že by hrozilo nevyčerpání programového rámce PRV prostřednictvím podnikatelských Fichí (např. poslední výzva MAS pro programový rámec PRV) a současně deleguje pravomoc schválení konkrétního znění přidaných Fichí na Programový výbor MAS Holicko.“

Dále dle posledních informací z NS MAS bude možnost kromě rozšíření programového rámce PRV o článek 20, nově přidat programový rámec OPŽP do SCLLD MAS Holicko. Jednalo by se o opatření zaměřené na sídelní zeleň, výsadbu mimo les – jen na území schválených ÚSES (územní systém ekologické stability) a protierozní opatření. Veškeré tyto aktivity máme kromě opatření proti větrné erozi ve strategické části SCLLD. Proto Valná hromada MAS Holicko přijala na svém jednání dne 29.11.2017 usnesení č. 14/2017:

„Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje přidání programového rámce OPŽP do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 – 2020 a současně deleguje pravomoc schválení konkrétního znění tohoto programového rámce na Programový výbor MAS Holicko.“

Z těchto důvodů Kontrolní výbor MAS Holicko nenavrhuje žádná další doporučení pro aktualizaci strategie CLLD MAS Holicko, kromě výše uvedených, jež byla schválena na jednání Valné hromady MAS Holicko dne 29.11.2017 (usnesení č. 14/2017, 15/2017).

V Holicích dne 3.5.2018

.....
Lenka Bezdíčková, Obec Jaroslav
Předsedkyně Kontrolního výboru MAS Holicko
